

	RELATÓRIO DA 2ª MEDIÇÃO		
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil/ Tec. Edif. TIAGO FERNANDO MARTINS	OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA - PROCESSO Nº 2384/2023	DATA: 02/05/2025

A Empresa **MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.881.771/0001-11, vem por meio do Engenheiro Civil / Téc. Edif. Tiago Fernando Martins, CREA Nº 11.842 D/GO, apresentar relatório de medição perante a solicitação realizada pela empresa MEGA ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA.

A. INTRODUÇÃO


O presente relatório de medição tem por objetivo verificar o avanço físico financeiro da obra no período, com base na vistoria técnica realizada na data 02/05/2025 para levantamento dos serviços executados.

B. ANÁLISE

Os serviços executados serão descritos abaixo:

1. SERVIÇOS INICIAIS

Nesta etapa já foram executados um percentual de **100,00% (cem por cento)** aos quais representam os serviços fornecimento e instalação de placa de obra e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).

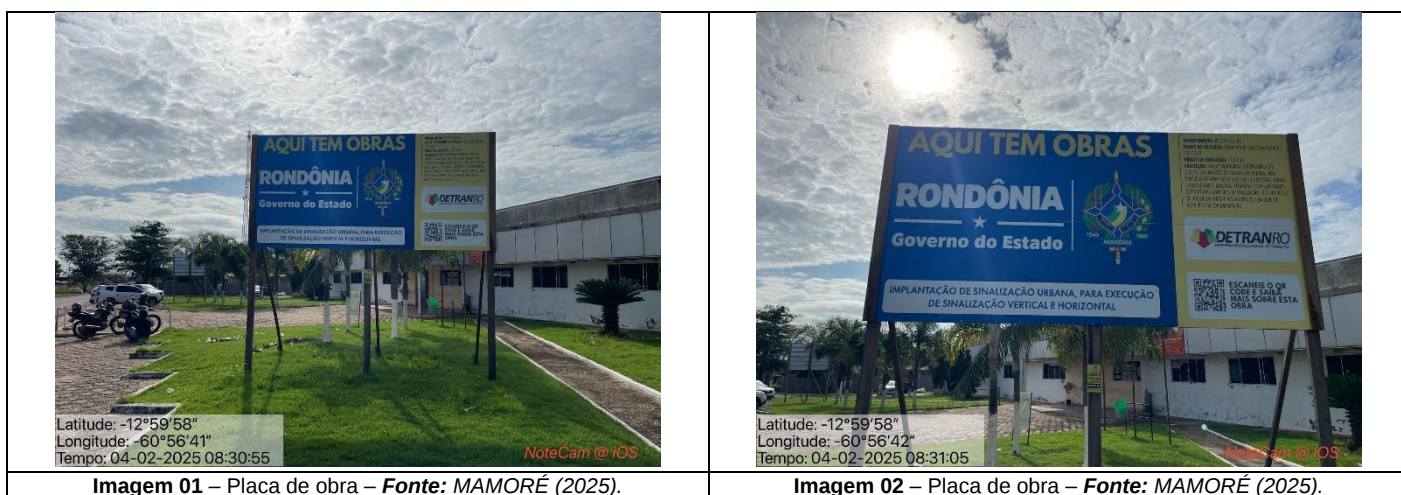

2. SINALIZAÇÃO URBANA - MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

Nesta etapa já foram executados um percentual de **68,09% (sessenta e oito vírgula nove por cento)** aos quais representam as seguintes etapas:

2.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL

Rua Francisco P Coelho Filho, 2633 – São João Bosco – CEP 76.803-820 – Porto Velho – Rondônia.

E-mail: comercial@mamoreprojetos.com.br

CNPJ. 06.881.771/0001-11

INSC. ESTADUAL 00000001399951

	RELATÓRIO DA 2ª MEDIÇÃO		
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil/ Tec. Edif. TIAGO FERNANDO MARTINS	OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA - PROCESSO Nº 2384/2023	DATA: 02/05/2025

Nesta etapa já foram executados um percentual de **93,88% (noventa e três vírgula oitenta e oito por cento)** aos quais representam os serviços referentes a placa de sinalização em aço R1, R-6A, A-18 e R-33, além do fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação.

 -12,9943S -60,9483W 02/05/2025 08:28	 -12,9995S -60,9380W 02/05/2025 09:30
Imagem 03 – Placa de regulamentação R-1 Fonte: MAMORÉ (2025)	Imagem 04 – Placa de advertência R-6A Fonte: MAMORÉ (2025)
 -12,9985S -60,9371W 02/05/2025 08:48	 -12,9984S -60,9473W 02/05/2025 08:58
Imagem 05 – Placa de regulamentação R-33 e R-2 Fonte: MAMORÉ (2025)	Imagem 06 – Placa de advertência A-18 Fonte: MAMORÉ (2025)

2.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Não foram identificados serviços nessa etapa de obra.

3. SINALIZAÇÃO URBANA - DISTRITO VITÓRIA DA UNIÃO

Nesta etapa já foram executados um percentual de **85,71% (oitenta e cinco vírgula setenta e um por cento)** aos quais representam as seguintes etapas:

3.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL

Nesta etapa já foram executados um percentual de **88,79% (oitenta e oito vírgula setenta e nove por cento)** aos quais representam os serviços referentes a placa de

Rua Francisco P Coelho Filho, 2633 – São João Bosco – CEP 76.803-820 – Porto Velho – Rondônia.

E-mail: comercial@mamoreprojetos.com.br

CNPJ. 06.881.771/0001-11

INSC. ESTADUAL 00000001399951



	RELATÓRIO DA 2ª MEDIÇÃO		
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil/ Tec. Edif. TIAGO FERNANDO MARTINS	OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA - PROCESSO Nº 2384/2023	DATA: 02/05/2025

sinalização em aço R1 e R-6ª, além do fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação.

 -13,0073S -61,1235W 02/05/2025 10:13	 -13,0102S -61,1261W 02/05/2025 10:24
Imagem 07 – Placa de regulamentação R-1 Fonte: MAMORÉ (2025)	Imagem 08 – Placa de advertência R-6A Fonte: MAMORÉ (2025)

3.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Não foram identificados serviços nessa etapa de obra.

4. SINALIZAÇÃO URBANA - DISTRITO GUARAJUS

4.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL

Nesta etapa já foram executados um percentual de **55,21% (cinquenta e cinco vírgula vinte e um por cento)** aos quais representam os serviços referentes a placa de sinalização em aço R1, R-6A e R-32B, além do fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação.

4.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Não foram identificados serviços nessa etapa de obra.

C. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentamos em anexo I planilha de medição solicitada pela empresa CONTRATADA, referente a segunda medição, no valor total de **R\$ 97.869,27 (noventa e sete mil oitocentos e sessenta e nove reais vírgula vinte e sete centavos)**, cujo demonstrativo financeiro contratual é de 44,62% (quarenta e quatro vírgula sessenta e dois por cento). O valor acumulado até o momento é de R\$ 154.471,64 (cento e cinquenta



 MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE	RELATÓRIO DA 2ª MEDIÇÃO		
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil/ Tec. Edif. TIAGO FERNANDO MARTINS	OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA - PROCESSO Nº 2384/2023	DATA: 02/05/2025

e quatro mil quatrocentos e setenta e um reais vírgula sessenta e quatro centavos), representando 70,43% (sessenta vírgula quarenta e três por cento) do contrato vigente.

Esta empresa responsável pela FISCALIZAÇÃO vem através deste solicitar que a Prefeitura Municipal de Corumbiara analise os documentos e prossiga com os atos administrativos.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Corumbiara, 02 de maio de 2025.

Atenciosamente;

MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI
 CNPJ 06.881.771/0001-11





Município de Corumbiara

63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
RELATÓRIO	2ª MEDIÇÃO	08/05/2025

ID:	321017	Processo	Documento
CRC:	2A17F1E9		
Processo:	1-2384/2023		
Usuário:	TIAGO FERNANDO MARTINS		
Criação:	08/05/2025 10:27:39	Finalização:	08/05/2025 10:29:11

MD5:	D71C1089F60DB846D6CE4DAB94E5DDD4
SHA256:	1A9F3FAE6900CC10B2674B5B58368653B335897F4C51363ED37CB376CC53E04B

Súmula/Objeto:
RELATÓRIO MEDIÇÃO

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORUMBIARA	RO	08/05/2025 10:27:39
---	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	08/05/2025 10:27:39
---	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA	TIAGO FERNANDO MARTINS	ENGENHEIRO	08/05/2025 10:29:19
---	------------------------	------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 321017 e o CRC 2A17F1E9.
